


ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA <i>projektová činnost ve výstavbě</i> IČ 87820641 DVORÁKOVA 1318/13 405 02 Děčín 2 tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz	
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK		
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38			DATUM	06/2022
MÍSTO STAVBY	p.č. 2463/1, 2463/9, 2463/17, 2463/33, 2463/41, 2468/10, 2470/5, 2470/9, 2470/10, 3011/3, k.ú.DĚČÍN			STUPEŇ	PD PRO VÝBĚR Z.
DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PROPOJENÍ LABSKÉ A PLOUČNICKÉ CYKLOSTEZKY DĚČÍN				MĚŘÍTKO	1 : 100
				Č. ZAKÁZKY	21/2022
PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY S VYZNAČENÍM OCHRANY TOKU A POSTUPU MONTÁŽE				Č. KOPIE	Č. VÝKRESU :
				PŘÍLOHA 1	


ŽB KONZOLA VE STANIČENÍ 20,0 – 100,0

POSTUP VÝSTAVBY


1. PŘÍPRAVA PLÁNĚ PRO ZÁSBOVÁNÍ PRO DILAT. ÚSEKY 1,2,3 resp. 4,5,6

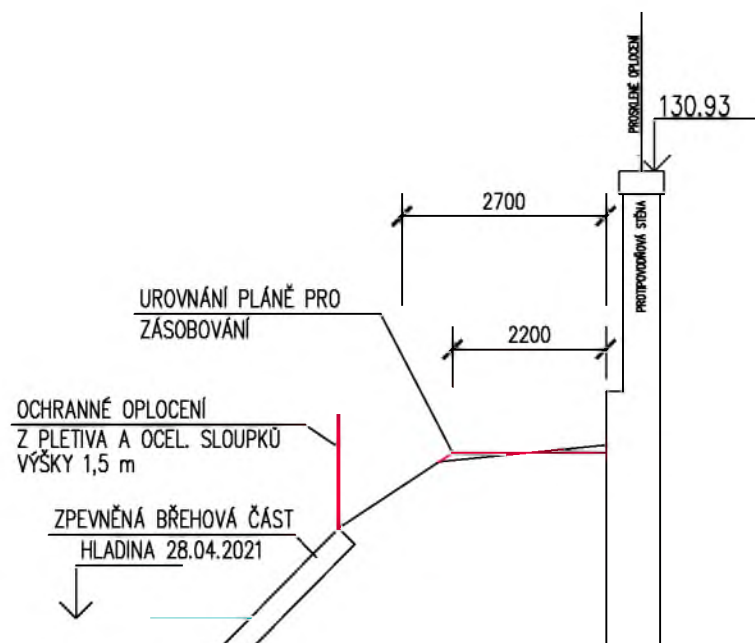


2. HLOUBENÍ ZÁKLADOVÉ RÝHY PRO JEDEN DILATAČNÍ ÚSEK

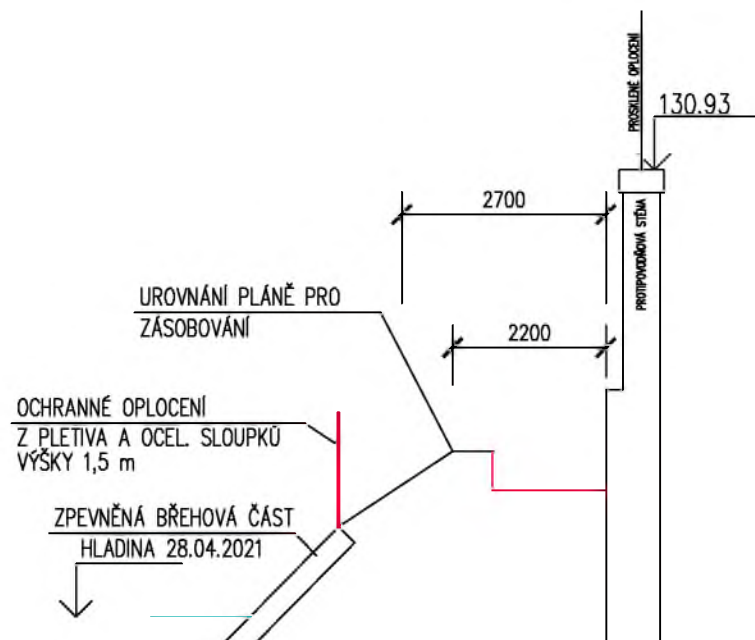


3. REALIZACE MIKROPILOT

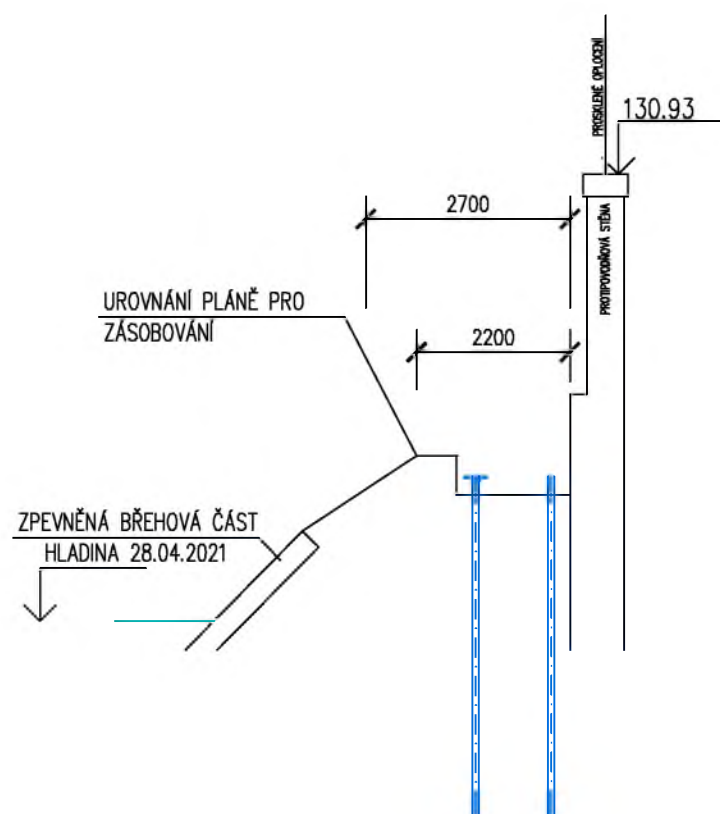

4. BETONÁŽ ZÁKLADOVÉ ČÁSTI KONZOLY DO UZAVŘENÉHO VÝKOPU

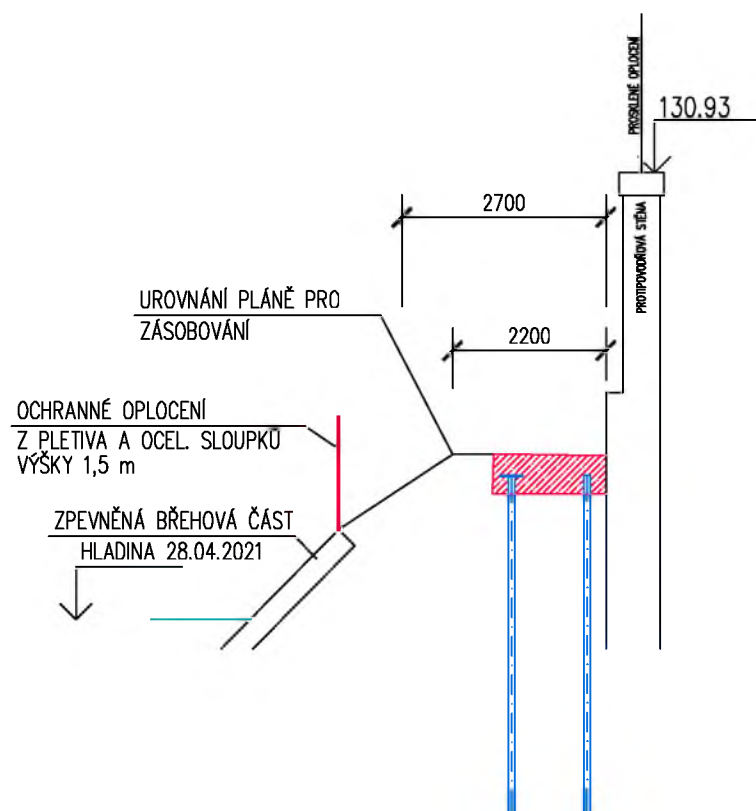


5. REALIZACE NADZEMNÍ ČÁSTI S POUŽITÍM BEDNĚNÍ

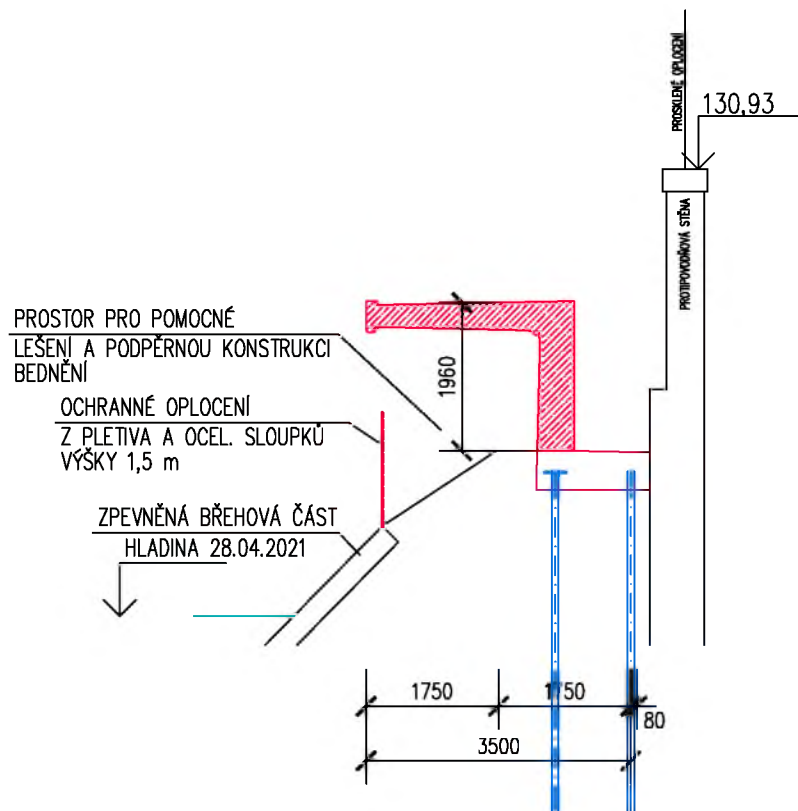

6. DOKONČENÍ STAVBY


- ZÁSYP NA RUBU S OSAZENÍM V.O.
- DOKONČENÍ POVRCHU Z AB
- MONTÁŽ ZÁBRADLÍ

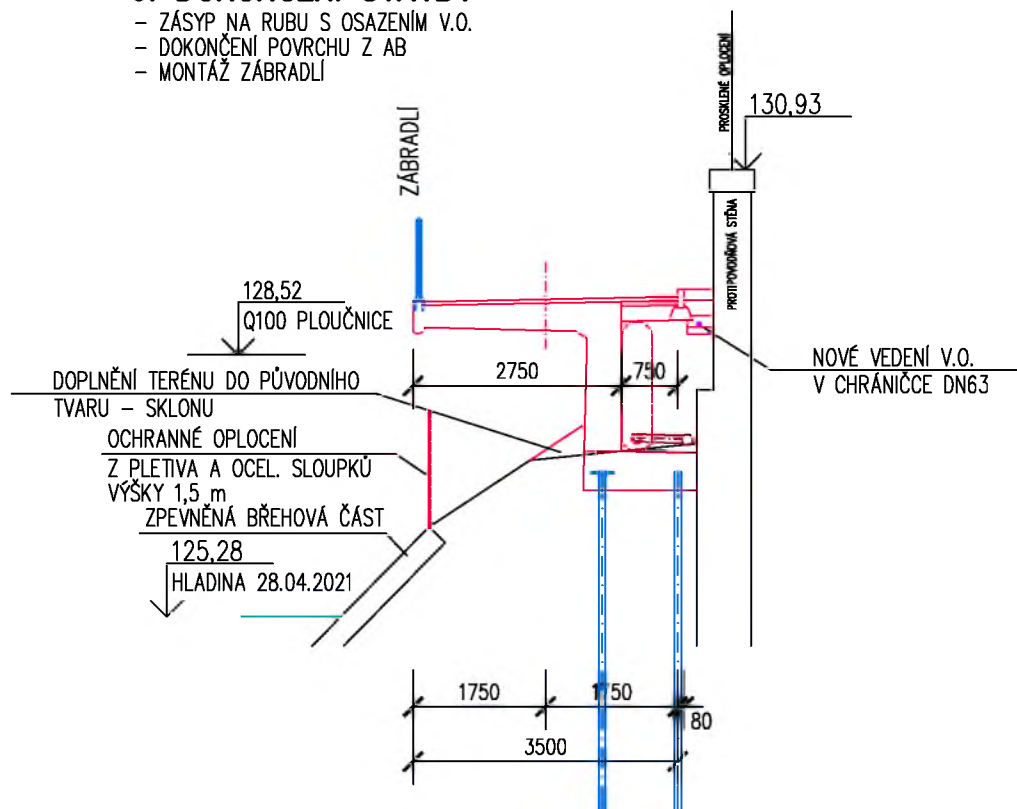


GABIONOVÉ OPĚRNÉ ZDI ŽB KONZOLA VE STANIČENÍ 131,64 – 370,05

POSTUP VÝSTAVBY


1. PŘÍPRAVA PLÁNĚ PRO ZÁSOBOVÁNÍ V CELÉ DÉLCE

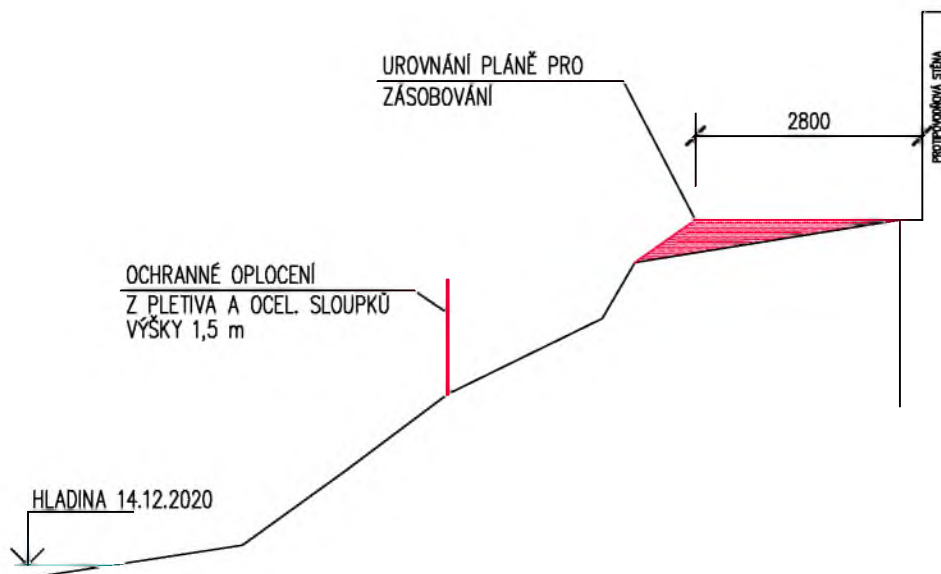

2. HLOUBENÍ RÝHY PRO JEDEN ÚSEK DÉLKY cca 20,0 m S POKLÁDKOU KSC

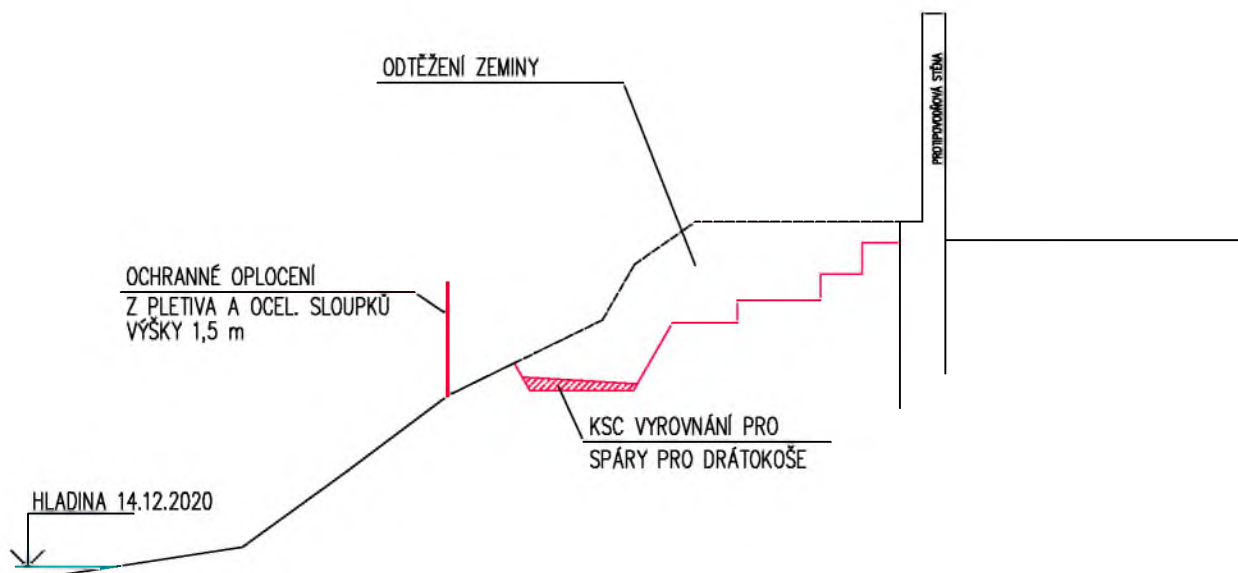

3. POSTUPNÁ VÝSTAVBA GABIONOVÉ STĚNY S ČÁSTEČNÝ ZÁSYPEM A POKLÁDKOU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V DÉLCE cca 20,0 m

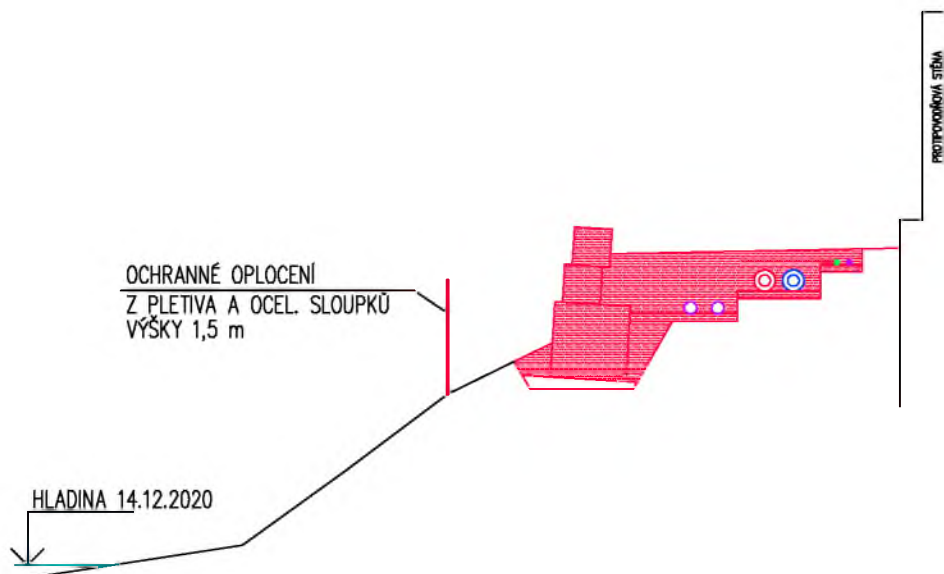

4. DOKONČENÍ STAVBY V CELÉ DÉLCE

- REALIZACE DLAŽBY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
- VÝSTAVBA SVÍTIDLE V.O.
- MONTÁŽ ZÁBRADLÍ

