

# SO 251

## Oprava opěrné zdi

<b>RAI</b> <b>PROJEKT</b> <small>MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE</small>  Pod Vodárnou 4746 466 05 Jablonec nad Nisou +420 734 158 363	vypracoval	ING.R.LOUTHANOVÁ	investor	SM DĚČÍN
	zodp. projektant	ING.R.LOUTHANOVÁ	zak. číslo	18-063
	akce : Oprava opěrné zdi v ul. Zemědělská, Děčín - Křešice		datum	03/2019
			stupeň	DSP, PDPS
			měřítko	
příloha:		Dopravně - inženýrské opatření	č. přílohy: <b>F.2.</b>	paré:

# Dopravně – inženýrská opatření

## 1. Úvod

Stavba se nachází v intravilánu města Děčín (562335), na katastrálním území Křešice u Děčína (607185) v ul. Zemědělská.

Oprava opěrné zdi bude probíhat bez vyloučení dopravy na přilehlých MK. Doprava bude lokálně omezena a to při vykládce a nakládce materiálu. V ul. Zemědělská je velmi slabý provoz a MK slouží především pro rezidenty.

Předpokládaná doba výstavby cca 2 měsíce.

Pro dopravní značení bude užito dopravních značek základního rozměru, barvy a provedení dle ČSN 01 8020. Jejich osazení musí odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65) a „Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – Technické podmínky II. vydání“ (TP 66).

Před zahájením prací bude návrh opatření odsouhlasen s DI PČR.

## 2. Dopravní opatření

### 2.1. Provizorní – po dobu opravy mostu

Předpokládá se provádění opravy pouze za lokálního omezení dopravy na MK. Řízení dopravy pomocí provizorních dopravních značek upozorňující na práce na silnici. V obou směrech na ul. Zemědělská, v ul. Dlouhá a v ul. Široká bude umístěno provizorní SDZ B30 Práce.

## 3. Výkaz dopravních značek

### 3.1. Přechodné dopravní značení

Typ	Ks	Popis
A15	6	Práce

## 4. Přílohy


4.1. Přehledná situace

4.2. Fotodokumentace

V Jablonci n.N., dne březen 2019

Vypracovala: Ing. Radka Louthanová

## 4.1. Přehledná situace

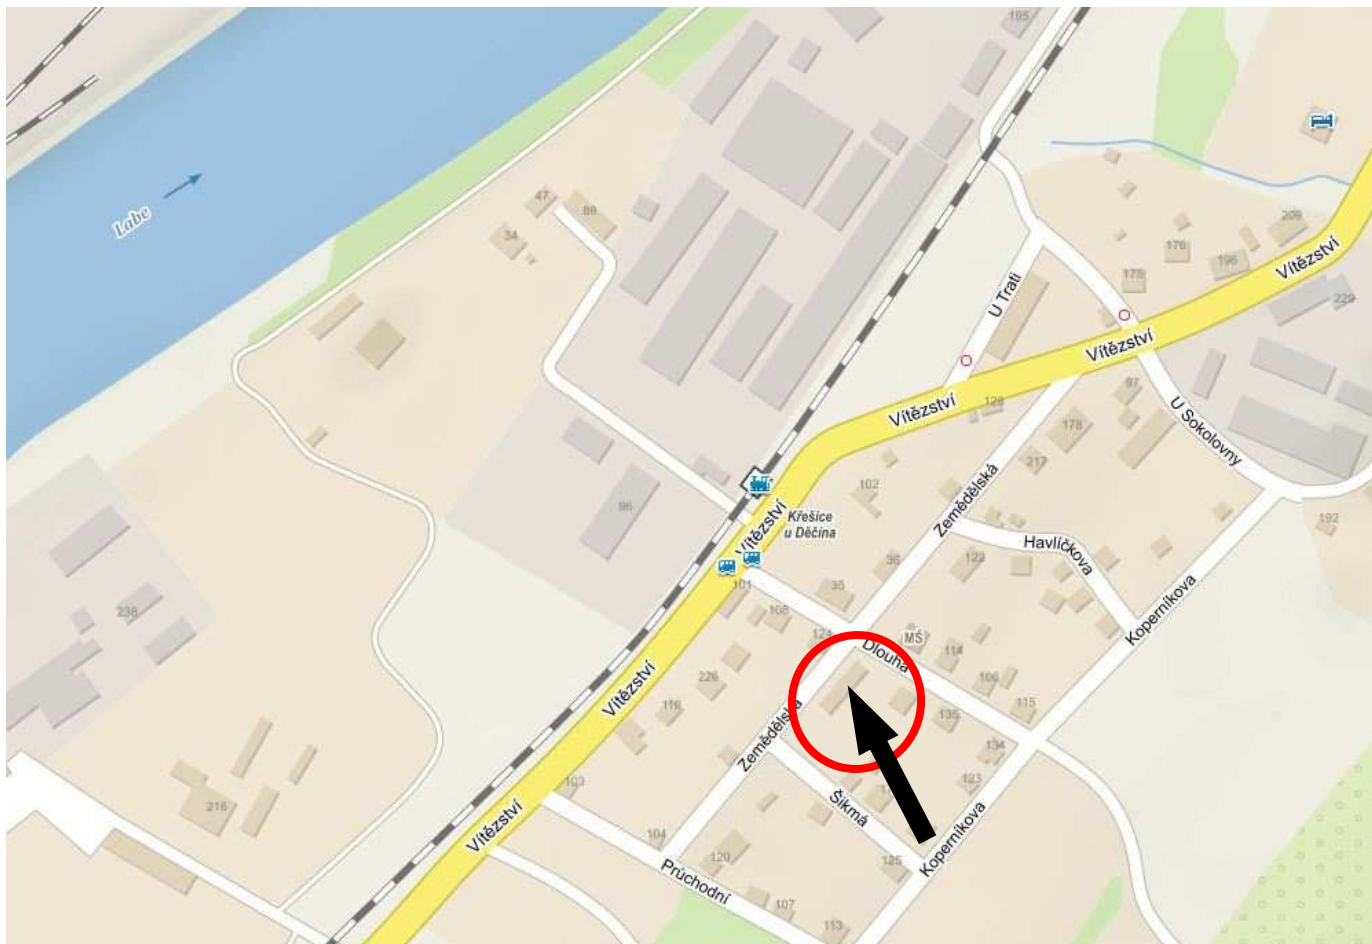

## 4.2. Fotodokumentace

