



KO-KA s.r.o., projekční a inženýrská kancelář

kancelář: Thákurova 7, 166 29 Praha 6

tel.: 224 355 440, 224 355 441, e-mail: ko-ka@ko-ka.cz



SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice



ÚTVAR PROJEKCE

Sladovnická 1082

463 11 LIBEREC - VRATISLAVICE

tel.: 485 340 511

fax: 485 340 558

DĚČÍN, Na Výšinách ***od č. p. 955 ke křižovatce s ul. Teplická***

rekonstrukce vodovodu a kanalizace


B8.13. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Číslo stavby: DC 007 309
Zak. č. inv.: 11191/4
Zak. č. zhot.: 2128/19
Stupeň: DPS
Datum: listopad 2019
Kraj: Ústecký
Investor: SVS a.s.

Generální ředitel: Ing. David Votava
Ředitel IPČ: Ing. Martin Opacki
Manažer útvaru: Ing. Václav Fridrich
Technická kontrola: Ing. Tomáš Nevole

HIP: Ing. Tomáš Nevole
Zodp. projektant: Ing. Milan Kletečka
Vypracoval: Ing. Miroslav Ouzký

Paré číslo:



I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba: DĚČÍN–NA VÝŠINÁCH OD Č.P. 955 KE KŘÍŽOVATCE S UL. TEPLICKÁ
Rekonstrukce kanalizace DC 007 309

Objekt: Dopravní řešení

Obec: Děčín

Kraj: Ústecký

Investor: SVS a.s.

z.č.: 320-19

srpen 2019

Vypracoval: TRASO-DC s.r.o.
ing. Ouzký Miroslav
Huntířov 191
405 02

II SITUACE

Předmětem zpracování dokumentace je návrh opatření pro připravovanou rekonstrukci kanalizace. Rozsah prací zahrnuje úsek místní komunikací ul. Na Výšinách v rozsahu mezi křižovatkou s ul. Teplická a č.p. 955. Jedná se o lokalitu severozápadním okraji středu města část Podmokly. Realizace prací je v jednosměrném úseku komunikace, na kterou je vjezd omezen dopravním značením pro vozidla s okamžitou hmotností nad 3,5 t. Komunikace na svém jižním okraji je napojena křižovatkou na průtahovou silnici I/13 ul. Teplická. Na komunikaci a v lokalitě dotčené stavbou nejsou vedeny linky BUS a ani se nenachází zastávky BUS.

III DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Návrh dopravního řešení je navržen jako jeden celek, neboť dopravní situace v místě, zdroje a cíle dopravy nevyžadují stavbu dělit na jednotlivé etapy.

Pro jednotlivé etapy jsou navržena taková opatření s úplnou uzavírkou komunikace tak, aby byla zachována maximální dopravní obslužnost celé lokality.

Po celou dobu stavby bude zachován průchod pro pěší v celé délce uzavírky komunikace. Trasa pohybu pěších bude oddělena od pracovního místa fyzickou zábranou.


IV NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ

Úplná uzavírka místní komunikace s částečným záborem do křižovatky s ul. Teplická, kde bude zachován volný průjezdný profil v šířce minimálně 5,5 m. Bez omezení provozu linek BUS.

Oddělení pracovního místa od prostoru pro pohyb pěších pomocí fyzických zábran.

V OSTATNÍ

Přístup a příjezd na jednotlivé pozemky bude prováděn vždy po dohodě s oprávněnou osobou na místě stavby. Kontakt na tuto osobu bude po dobu akce k dispozici v daném úseku nejlépe písemně na označení staveniště. **Samotné pracovní místo bude pohyblivé a po svém dokončení a přesunutí bude vždy řádně zasypáno a případně dočasně zadlážděno, tak aby byl zajištěn jeho bezkolizní pojezd. Pracovní místo fyzicky odděleno od tras pro pěší pro zajištění bezpečnosti chodců v provedení dle schéma B/17 viz. TP 66.**

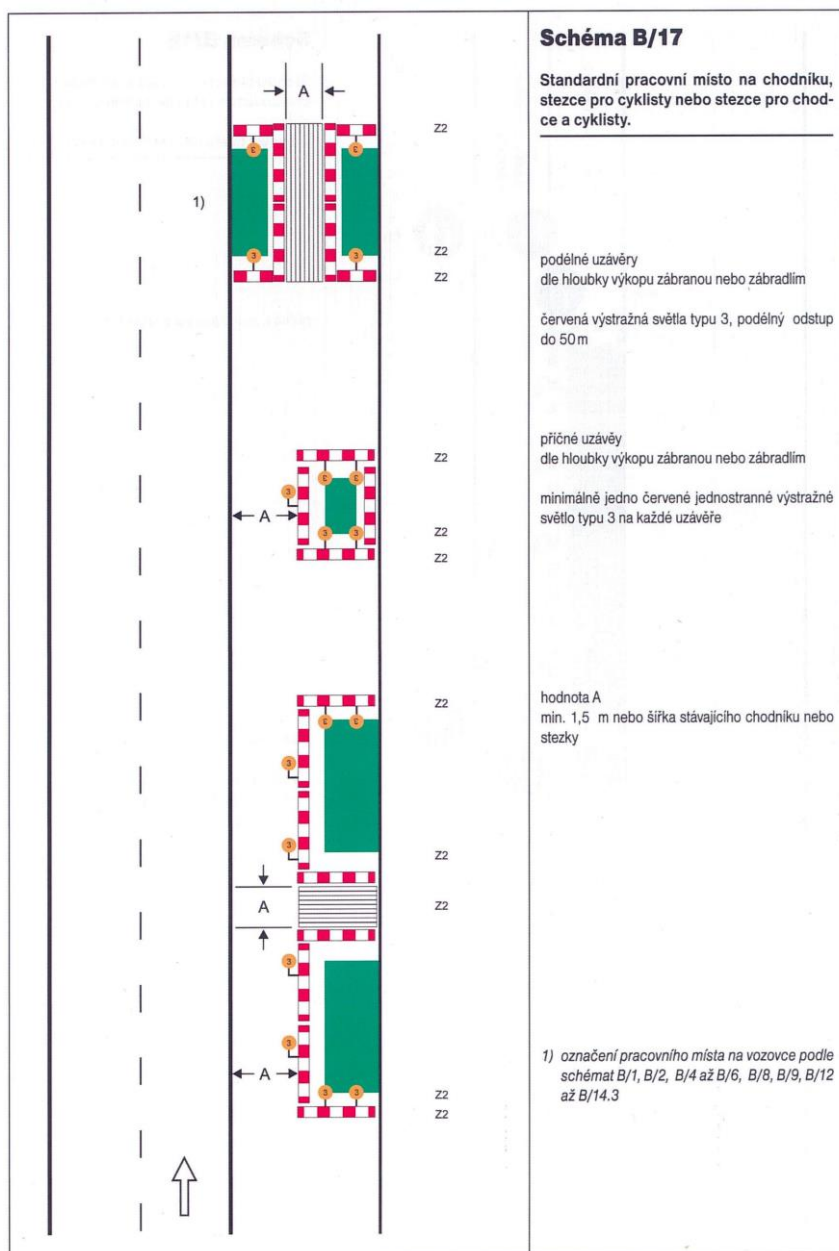


Vzhledem k dopravnímu významu, směru, dopravnímu zatížení a rozsahu stavby není vyznačena objízdná trasa.

S ohledem na dobu trvání jednotlivých etap bude osazení přechodného dopravního značení realizováno technicky pro maximální snížení rizika ovlivnění jeho stability a funkčnosti povětrnostními podmínkami.

Při osazení a údržbě budou dodržovány a ustanovení z.č. 361/2000 Sb., vyhl. MDS č 30/2001 Sb., a podmínky TP 66, TP 65.

Dodávku a osazení provede odborně způsobilý subjekt na základě dokumentace schválené příslušným silničním správním úřadem pro dané komunikace.

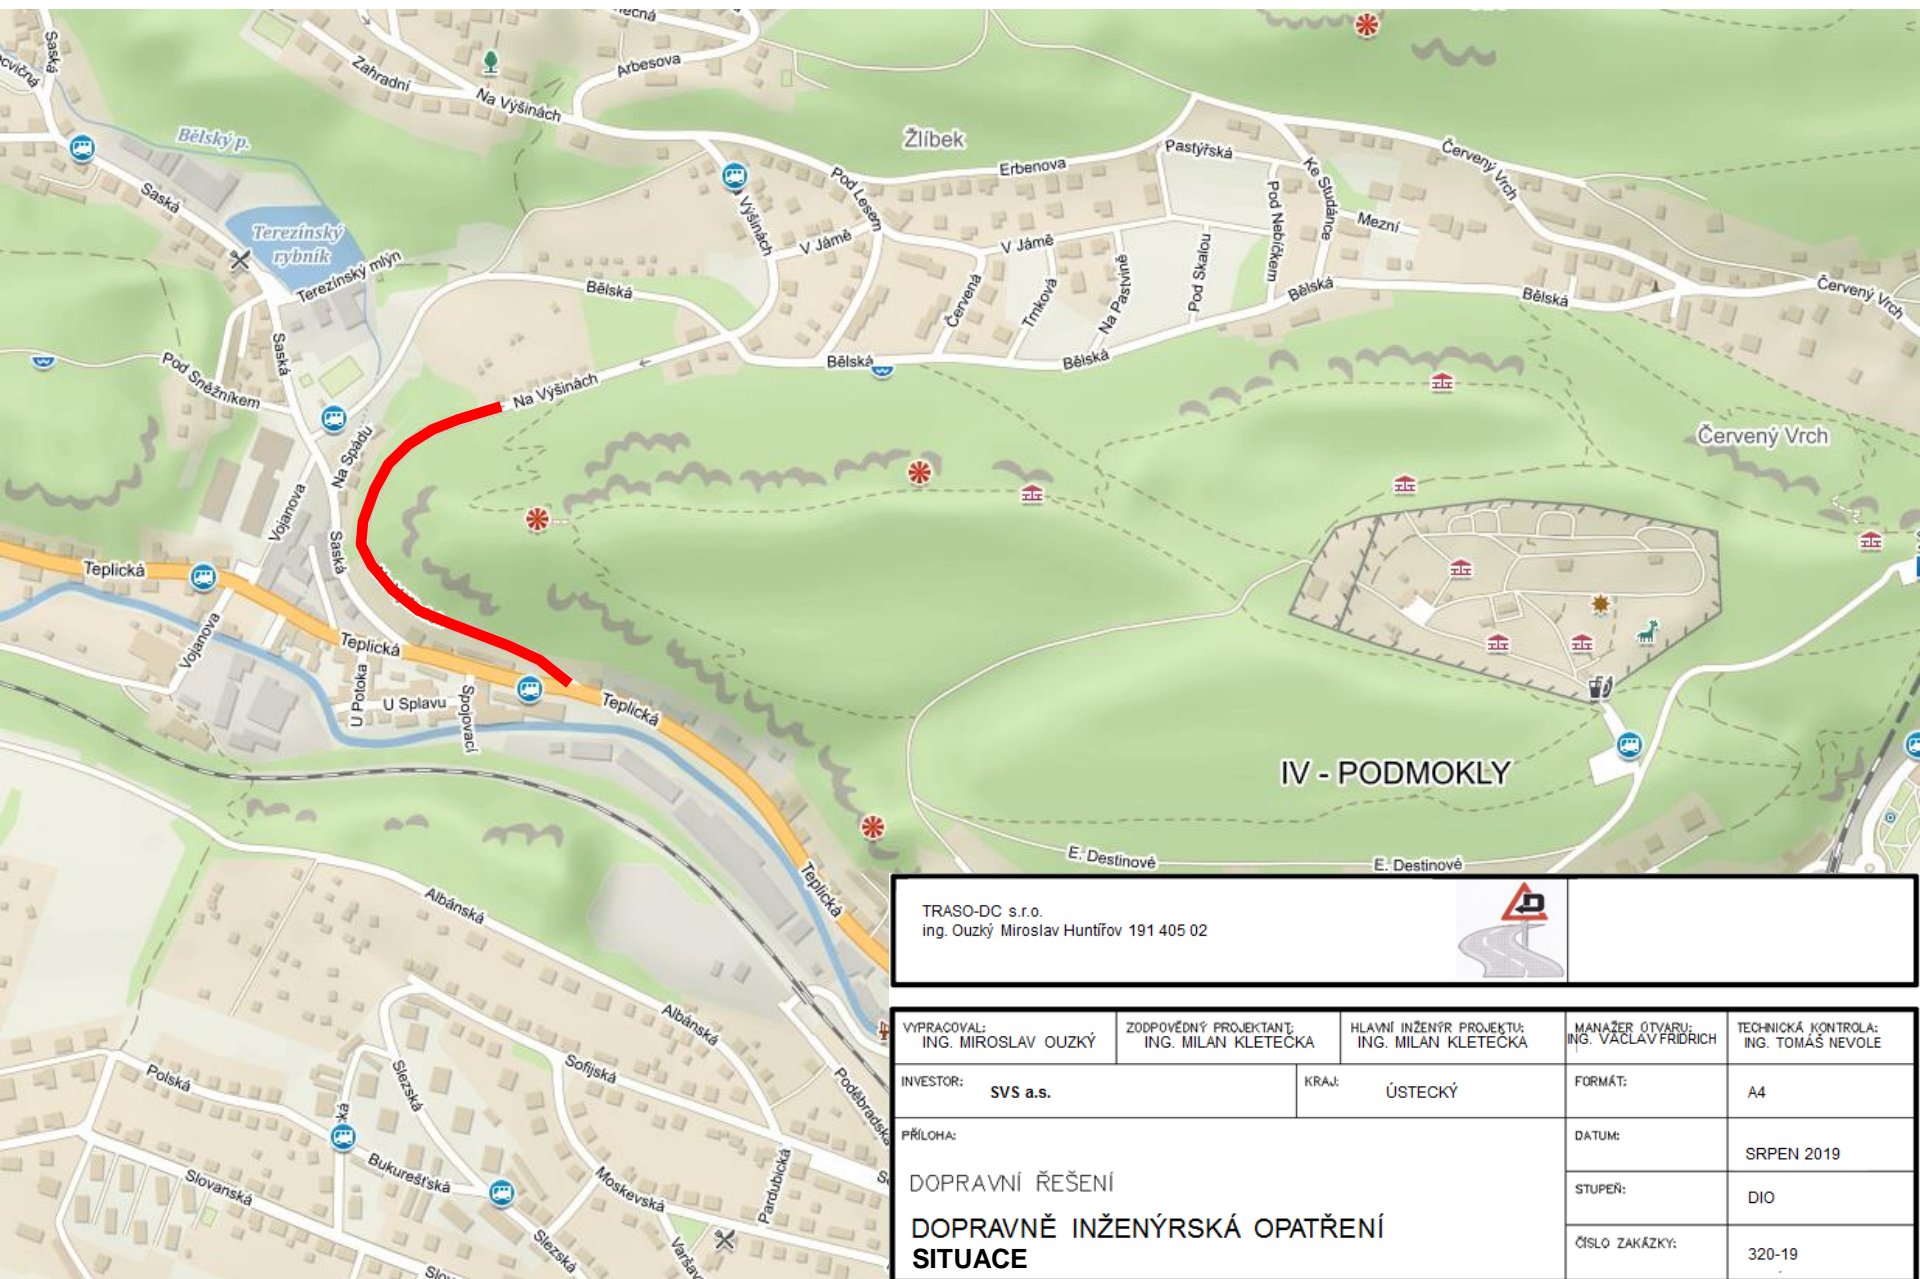

TRASO-DC s.r.o.
ing. Ouzký Miroslav Huntřov 191 405 02

VYPRACOVAL: ING. MIROSLAV OUZKÝ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MILAN KLETEČKA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. MILAN KLETEČKA	MANAŽER OTVARU: ING. VACLAV FRDŘICH	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. TOMÁŠ NEVOLÉ
INVESTOR: SVS a.s.		KRAJ: ÚSTECKÝ	FORMÁT:	A4
PŘÍLOHA:			DATUM:	SRPEN 2019
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SITUACE			STUPEŇ:	DIO
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	320-19
AKCE: DĚČÍN, NA VÝŠINÁCH OD Č.P. 955 KE KŘIŽOVATCE S UL. TEPLICKÁ - REKONSTRUKCE KANALIZACE DC 007 309		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: .0	ČÍSLO PARÉ:



VÝPRACOVAL: ING. MIROSLAV OUZKÝ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MILAN KLETEČKA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. MILAN KLETEČKA	MANAŽER OTVÁRU: ING. VACLAV FRIDRICH	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. TOMÁŠ NEVOLE
INVESTOR: SVS a.s.	KRAJ: ÚSTECKÝ	FORMÁT: A4	DATUM: SRPEN 2019	STUPEŇ: DIO
PŘÍLOHA: DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			ČÍSLO ZAKÁZKY: 320-19	ČÍSLO PARE: 1
AKCE: DĚČÍN, NA VÝŠINÁCH OD Č.P. 955 KE KŘÍŽOVATCE S UL. TEPLICKÁ - REKONSTRUKCE KANALIZACE DC 007 309		MĚRÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARE:

